

FORMATO DE INFORMACIÓN GENERAL

Fecha:

1. UBICACIÓN DE LA OBRA

Región:

Provincia :

Distrito:

Avenida / calle:

Mz, lote, número

2. NOMBRE DE LA OBRA A EJECUTAR:

3. DATOS DEL EQUIPO TÉCNICO ENCARGADO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Residente de obra

Nº CIP/CAP

Ingeniero de Seguridad

Nº CIP/CAP

4. DATOS DEL EQUIPO TÉCNICO ENCARGADO DE LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA

Gerente de Supervisión

Nº CIP/CAP

Supervisor de Obra

Nº CIP/CAP

5. DATOS DEL CLIENTE Y/O REPRESENTANTE LEGAL

Nombre del Cliente

DNI/RUC

RESPONSABLE DE OBRA

RESPONSABLE DEL LLENADO DE DATOS

FORMATO DESCRIPCIÓN RESUMEN DE LA OBRA POR ESPECIALIDADES - PRESUPUESTO

Fecha:

PRESUPUESTO RESUMEN DE OBRA

RUBROS	MONTO (S/.)
Costo Directo	
1. Estructuras	
2. Arquitectura	
3. Instalaciones Sanitarias	
4. Instalaciones Electricas	
5. Otros	
Subtotal 1	
Costo Indirecto	
6. Gastos generales fijos	
7. Gastos generales variables	
8. Utilidad	
Subtotal 2	
9. Subtotal	
10. IGV 18%	
Costo de Ejecución de la Obra	

PRESUPUESTO DE MATERIALES POR ESPECIALIDADES

RUBROS	MONTO (S/.)
Costo Directo	
1. Presupuesto de materiales Estructuras	
2. Presupuesto materiales Arquitectura	
3. Presupuesto Materiales Instalaciones Sanitarias	
4. Presupuesto Materiales Instalaciones Electricas	
5. Presupuesto Materiales Otros	
Costo Materiales de Construcción	

RESPONSABLE DE OBRA_____
RESPONSABLE DEL LLENADO DE DATOS

FORMATO RESUMEN DE DATOS TÉCNICOS DE LA OBRA A EJECUTAR

Fecha:

1. MODALIDAD DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

2. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

3. PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

4. FECHA DE INICIO DE OBRA

5. FECHA DE CULMINACIÓN DE OBRA

6. PROPIETARIO DEL TERRENO

7. AREA DEL TERRENO DONDE SE EJECUTARÁ LA OBRA (m2)

8. AREA CONSTRUIDA DE LA OBRA (m2)

9. AREA LIBRE DE LA OBRA (m2)

RESPONSABLE DE OBRA

RESPONSABLE DEL LLENADO DE DATOS

FORMATO DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MATERIALES

Fecha:

1.IDENTIFICACIÓN DE LOS MATERIALES


CODIGO	MATERIAL	UND	CANTIDAD	COSTO DE MATERIALES (S/.)

RESPONSABLE DE OBRA

RESPONSABLE DEL LLENADO DE DATOS

FICHA DE CONTROL DE MAPAS DE FLUJO DE LOS PROCESOS DE SELECCION (C-1)

1. MAPA DE FLUJO DEL PROCESO DE SELECCIÓN

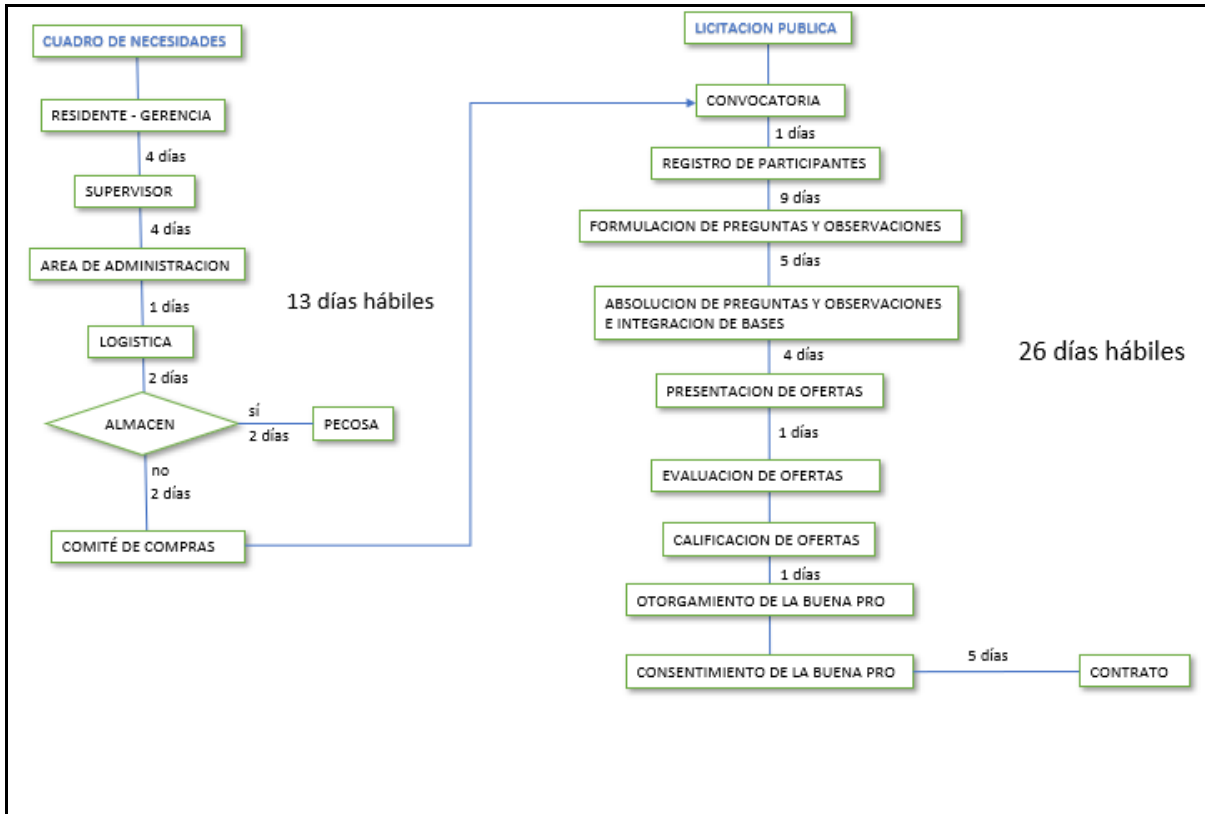


RESPONSABLE DE OBRA

RESPONSABLE DEL LLENADO DE DATOS

FICHA DE CONTROL DE MAPAS DE FLUJO DE LOS PROCESOS DE SELECCION (C-1)

1. MAPA DE FLUJO DEL PROCESO DE SELECCIÓN

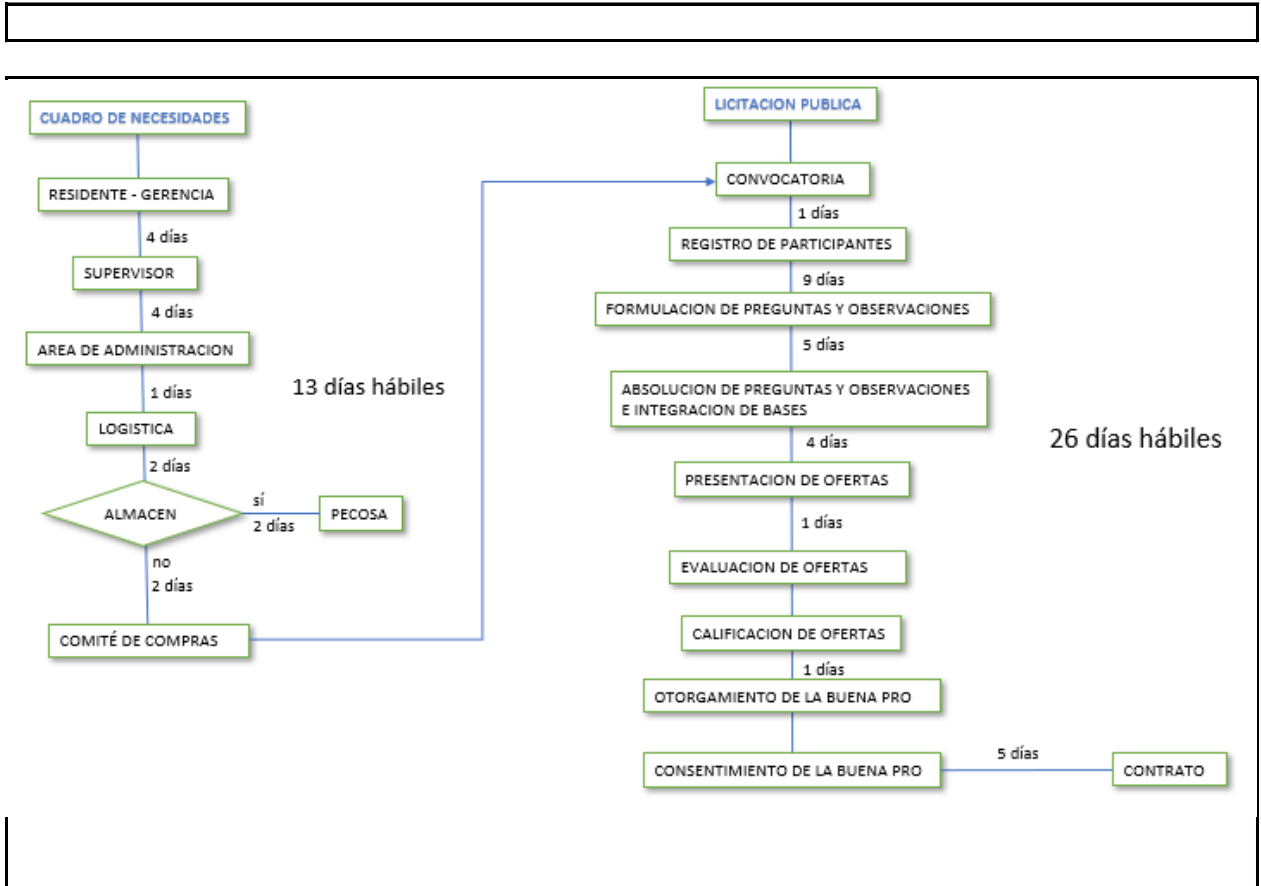


RESPONSABLE DE OBRA

RESPONSABLE DEL LLENADO DE DATOS

FICHA DE CONTROL DE MAPAS DE FLUJO DE LOS PROCESOS DE SELECCION (C-1)

1. MAPA DE FLUJO DEL PROCESO DE SELECCIÓN

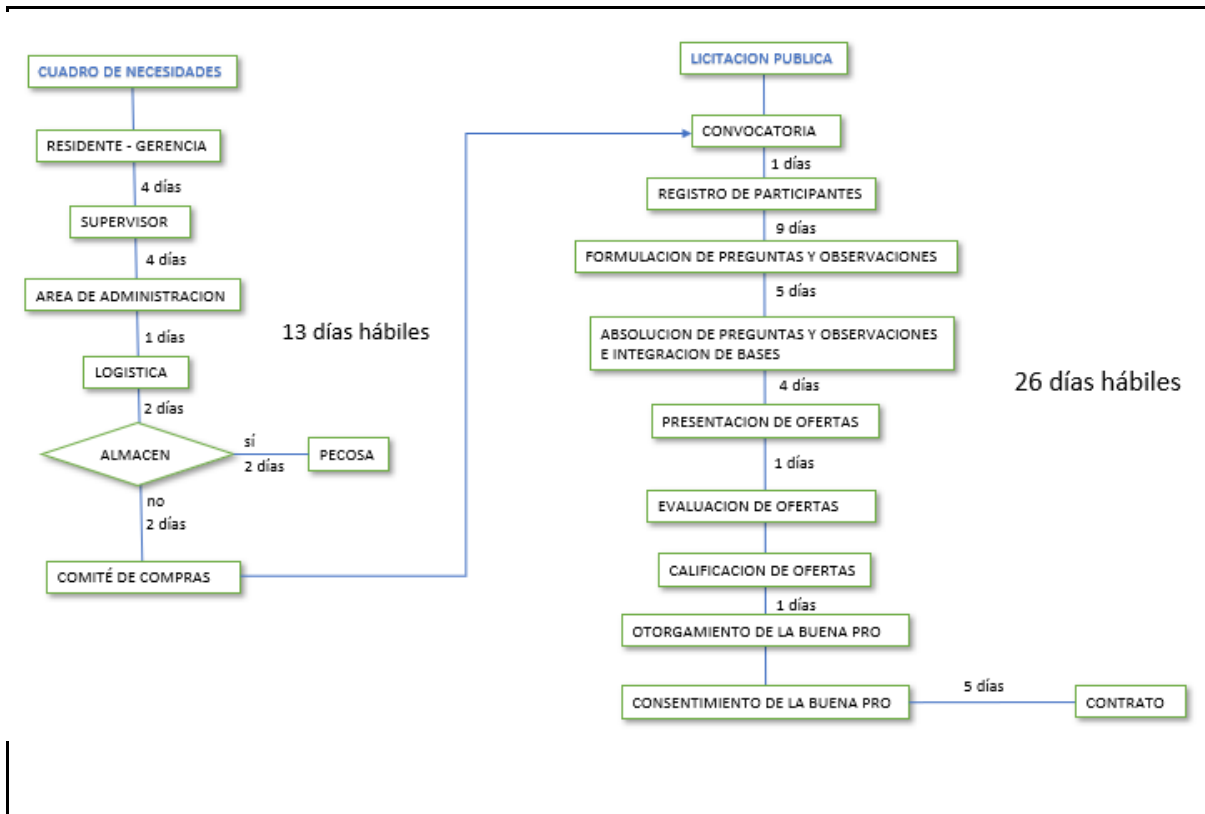

RESPONSABLE DE OBRA

RESPONSABLE DEL LLENADO DE DATOS

FORMATO DE CONTROL DE LOS PROCESOS DE SELECCION UTILIZADOS

IDENTIFICACIÓN DE LAS CAUSAS QUE GENERAN AMPLIACIONES POR MATERIALES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS POR ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA DIRECTA.

Proceso	Breve descripción de las causas que generaron ampliaciones por materiales.	Condiciones en que se generaron

RECOMENDACIONES:

RESPONSABLE DE OBRA

RESPONSABLE DEL LLENADO DE DATOS

FORMATO DE RETROALIMENTACION DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN

FECHA DEL CONTROL:

CONSOLIDADO DE LAS LIMITACIONES Y DIFICULTADES QUE SE TUVIERON DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE SELECCION.

Proceso	Descripción de las limitaciones durante la ejecución del proceso.	Descripción de las dificultades durante la ejecución del proceso.

CONCLUSIONES:

RECOMENDACIONES:

RESPONSABLE DE OBRA

RESPONSABLE DEL LLENADO DE DATOS

n°	SNIP	Nombre	Fecha de Inicio	Presupuesto inicial	Presupuesto real	Plazo inicial de ejecución (Días calendarios)	Plazo real de ejecución (Días calendarios)	Plazo aumentado	Numero de ampliaciones	Numero de ampliaciones por materiales	Días adicionados por materiales
1		CONSTRUCCION DE CARRETERA TACNA – TARATA – CANDARAVE – UMALSO; TRAMO TARATA (Km 87+000) – TICACO (Km 97+500	15 de Diciembre del 2007	15'019,525.20	26'395,179.14	150	748	598	7	5	434
2	41752	RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E.I. N° 406 EN EL DISTRITO GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA	23 de junio del 2008	606437.38	638771.19	120	185	65	2	1	46
3	35804	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. MANUEL A. ODRIA	17 de junio del 2009	5'453,211.12	5'328,253.94	180	288	108	2	0	0
4	134921	MEJORAMIENTO DE LA I.E. ALFONSO UGARTE DE ALTO PERU EN EL DISTRITO DE PALCA - TACNA	22 de febrero del 2010	1' 888,982.02	2'177,743.55	240	509	269	4	2	103
5	108551	REHABILITACION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL PUEBLO JOVEN AMPLIACION SAN MARTIN, DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA - TACNA	28 de Abril del 2010	2'571,441.41	2'481,117.69	270	392	122	3	2	63
6	109960	REHABILITACION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL PUEBLO JOVEN ELOY G. URETA DISTRITO ALTO DE LA ALIANZA-TACNA-TACNA	03 de mayo del 2010	1'102,450.66	1'002,447.07	150	225	75	2	1	15
7	43098	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N° 42019 LASTENIA REJAS DE CASTAÑON DEL DISTRITO DE TACNA	05 de Mayo del 2010	5'101,004.00	5'476,312.74	240	415	175	3	2	62
8	59515	MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N° 42245 MICAELA BASTIDAS DEL DISTRITO ALTO DE LA ALIANZA-TACNA	07 de junio del 2010	1' 105,032.71	1'103,362.08	120	150	30	1	0	0
9	61426	MEJORAMIENTO DE LA I.E.I. N° 340 DIVINO NIÑO JESUS EN EL CP LA YARADA DEL DISTRITO DE TACNA	12 de julio del 2010	749090.8	759811.81	120	150	30	1	1	30
10	15166	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA	09 de Agosto del 2010	8'028,735.51	8'866,901.96	240	1393	1153	10	3	316
11	86138	MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MODESTO BASADRE, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA TACNA, REGION TACNA	16 de Agosto del 2010	13'662,567.38	15'097,851.22	365	2,294	1929	12	6	595

12	172740	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA UNIDAD FORMULADORA Y DE LA OFICINA EJECUTIVA DE PROGRAMACION E INVERSIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE TACNA, DISTRITO Y PROVINCIA DE TACNA	14 de Febrero del 2011	689615.03	772978.38	75	305	230	3	3	205
13	138595	MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD TARATA DEL DISTRITO DE TARATA, PROVINCIA TARATA TACNA	20 de septiembre del 2011	4'757,975.86	5'349,057.43	225	1200	975	6	3	240
14	199385	CREACION DEL LOCAL DE USOS MULTIPLES EN EL ANEXO DE CINTO, DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE - TACNA	12 de Noviembre del 2012	602638.71	677716.26	150	245	95	1	0	0
15	45609	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE ASISTENCIA Y OPERATIVIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL C.S. ALTO PERU - MICRORED ALTO ANDINO - DISTRITO DE PALCA - TACNA	04 de noviembre del 2013	2'340,262.92	2'401,964.11	240	330	90	1	1	90
16	237508	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA I.E.I. N 443 SANTA TERESITA EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA PROTER SAMA, DISTRITO DE INCLAN - TACNA TACNA	01 de octubre del 2014	1'188,978.32	1'237,990.40	151	189	38	1	1	38
17	251116	MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LOS SERVICIOS DE ATENCION COMUNITARIA EN LAS JUNTAS VECINALES SANTA ANA Y PACHECO CESPEDES, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA TACNA - TACNA	19 de Noviembre del 2014	3'176,927.66	3'328,380.04	150	301	151	5	1	23
18	61593	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PUESTO DE SALUD CORACORANI, DISTRITO DE TARATA - REGION TACNA	07 de diciembre del 2015	1'824,494.11	2'027,361.31	150	549	399	8	4	129
19	373706	AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO PROVISIONAL DEL COLEGIO DE ALTO RENDIMIENTO (COAR) - TACNA	06 de Febrero del 2017	2, 377,471.81	2, 803,862.52	120	278	158	3	2	133
20	147471	AMPLIACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE CALANA A 500 L/S EN LA PROVINCIA DE TACNA	20 de septiembre del 2017	1'965,954.75	2'241,552.67	180	406	226	4	2	104
